

OMPI



MM/A/42/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de agosto de 2009

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

**UNIÓN PARTICULAR PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS (UNIÓN DE MADRID)**

ASAMBLEA

Cuadragésimo segundo período de sesiones (18° ordinario)
Ginebra, 22 de septiembre a 1 de octubre de 2009

**PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(SISTEMAS DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MADRID Y DE LA HAYA):
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES Y NUEVAS MEDIDAS
PROPUESTAS**

preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. El objeto del presente documento es doble. Presenta un informe de la Oficina Internacional sobre el estado de cumplimiento del Programa de modernización de las Tecnologías de la Información (T.I.) en el ámbito de los sistemas de apoyo informático a las Uniones de Madrid y de La Haya, según se describe en los documentos MM/A/38/4 y H/A/24/2 y se resume en el Anexo I adjunto. Además, indica las posibles maneras de proseguir la realización del programa.

2. La iniciación del Programa de modernización de las tecnologías de la información se aprobó en las Asambleas de la Unión de Madrid y de la Unión de La Haya en septiembre de 2007. El calendario de realización del programa constaba de dos fases, extendidas durante un período de cuatro años (2008-2011), a las que podía agregarse una tercera fase, a un costo total estimado en unos 15,3 millones de fr.s. para las tres fases. Un informe sobre la marcha de las actividades se presentó a las Asambleas de la Unión de Madrid y de la Unión de La Haya en septiembre de 2008 y figura en los documentos MM/A/40/3 y H/A/26/2.

3. La ejecución de la Fase I del programa se aprobó en las Asambleas por un costo estimado de inversión de 5,028 millones de fr.s., sufragados de la forma siguiente¹:

– 2.900.000 fr.s. de los programas 18 (1 millón) y 27 (1,9 millones) de la primera versión del Presupuesto por programas para 2008/09, es decir, los programas 6 y 25 del presupuesto por programas revisado de dicho bienio²;

– 2.128.000 fr.s. del excedente registrado en el presupuesto de la Unión de Madrid al cierre del ejercicio 2007.

4. La Asamblea de la Unión de Madrid decidió también que toda porción del excedente mencionado superior a la cantidad necesaria para mantener el nivel previsto de reservas (25% del gasto estimado en el bienio 2008/09 (factor PGBE)) se mantuviera en los fondos de reserva y de operaciones de la Unión de Madrid, a los efectos de contribuir a la financiación de las subsiguientes fases del Programa de modernización de las tecnologías de la información³.

II. FASE I – ESTADO DE EJECUCIÓN

5. En los primeros 18 meses de ejecución de la Fase I (de enero de 2008 a junio de 2009), se registraron importantes avances en lo que tiene que ver con varios subproyectos, especialmente los A1, A2, A5, A6, A7, B1 y B5.

a) Mejoramiento de la productividad interna

6. Este objetivo se alcanzará al término de los proyectos A1 a A7.⁴ Los subproyectos A1, A2, A5, A6 y A7 se terminarán durante 2009.

7. En el marco del Subproyecto A1 (Traducción), se está probando una aplicación destinada a automatizar la traducción de limitaciones, designaciones posteriores y decisiones finales para el registro de marcas mediante la adaptación de las partes de las listas de productos y servicios ya contenidas en el registro original. Se prevé su aplicación práctica a partir de septiembre de 2009.

8. En el marco del Subproyecto A2 (Clasificación), se encuentra en elaboración una aplicación de Internet destinada a asistir a los usuarios del Sistema de Madrid en la confección de listas de productos y servicios con sus indicaciones clasificadas correctamente. Esta herramienta de clasificación electrónica permitirá a los usuarios efectuar búsquedas en una base de datos para obtener indicaciones aceptables de productos y servicios, reconocidas por la Oficina Internacional. Un prototipo de esta aplicación se está probando desde mayo de 2009.

¹ Párrafos 35, 36 y 42 del documento MM/A/38/4, y párrafo 14 del documento H/A/24/2.

² La financiación con cargo al presupuesto de la Unión de Madrid se eleva a una cantidad estimada en 2.441.000 fr.s., mientras que la del presupuesto de la Unión de La Haya se estima en 459.000 fr.s.

³ Párrafo 41 del documento MM/A/38/6.

⁴ El contenido de estos subproyectos se menciona en el Cuadro 1 del Anexo I.

9. En el marco del Subproyecto A5 (Supervisión y estadística), se está elaborando una aplicación de Internet para unificar y racionalizar el proceso de producción de estadísticas relacionadas con las operaciones de los Sistemas de Madrid y de La Haya, en ambos casos para fines de supervisión e información general. La nueva aplicación ofrecerá un acceso en línea a una amplia gama de datos estadísticos, además de las estadísticas mensuales y anuales actualmente disponibles. La aplicación suministrará asimismo medios para la búsqueda por criterios tales como el año, la oficina de origen y la Parte Contratante del caso. La aplicación se está probando desde el 31 de mayo de 2009. Entrará en funcionamiento a partir de septiembre de 2009.

10. En el marco del Subproyecto A6 (Automatización de la gestión), destinado a integrar algunas tareas administrativas adicionales en los sistemas MAPS/DMAPS, se han preparado nuevas aplicaciones para sustituir ciertos procesos manuales o escritos por aplicaciones automatizadas, por ejemplo, un nuevo procedimiento de impresión basado en el lector óptico de marcas (OMR), la automatización del sistema de notificaciones por correo electrónico certificado y la creación automática de copias certificadas de las inscripciones de La Haya.

11. En el marco del Subproyecto A7 (Mejoras en el IMAPS), el trabajo realizado hizo posible, desde mayo de 2009, exportar documentos en formato PDF por Internet, lo que permite mejorar la eficiencia gracias a un mejoramiento de las funciones de indización e impresión. Prosiguen los esfuerzos también en otros terrenos, tales como la creación de medios para el almacenamiento de documentos PDF en IMAPS y la importación programada de documentos, incluidos los faxes y correos electrónicos, directamente a los sistemas IMAPS.

b) Ampliación de los medios para cumplir por vía electrónica los trámites con las oficinas, los titulares y los representantes

12. Este objetivo se alcanzará al término de los Subproyectos B1 a B6 y C5.⁵ La realización de algunos de estos subproyectos depende de que se alcance el objetivo de la creación de herramientas de arquitectura orientada a los servicios (con arreglo al Subproyecto C3). No obstante, donde ello fue posible, ya se inició la preparación de los proyectos.

13. Algunas funciones de los Subproyectos B1, B2 y B3 se elaborarán y reunirán en una sola aplicación de Internet. Tras obtener el acceso a una cuenta del Centro de Usuarios de la OMPI, los titulares y representantes tendrán la posibilidad de gestionar y ejecutar electrónicamente, a través de Internet, un cierto número de transacciones de sus carteras de Madrid. La primera versión de esta aplicación estará disponible en el último trimestre de 2009 y se actualizará una vez terminada la elaboración de los nuevos servicios por Internet en 2010.

14. En el marco del Subproyecto B1 (Pago electrónico, factura electrónica), se dispone actualmente de una facilidad de pago electrónico por Internet para abonar las tasas adeudadas por cada transacción con arreglo a los procedimientos de Madrid y de La Haya. El pago puede efectuarse con tarjeta de crédito o a través de una cuenta corriente.

⁵ El contenido de estos subproyectos figura en el Cuadro 2 del Anexo I.

15. En el marco del Subproyecto B5 (Comunicación electrónica: OMPI → Titulares / Representantes), se ha introducido, con efecto a partir del 5 de febrero de 2009, una versión electrónica de la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales*, en sustitución de la versión impresa convencional, lo que permitirá un ahorro de 200.000 fr.s. en 2009. Esto se añade a los logros anteriores del Subproyecto, como la introducción de un sistema de notificación por correo electrónico certificado y diversas mejoras de la base de datos ROMARIN (por ejemplo, la indicación, desde julio de 2008, si así procede, de que ha vencido el plazo de denegación sin que la Oficina Internacional haya registrado ninguna notificación de denegación provisional de la oficina de cualquier Parte Contratante mencionada en el Registro pertinente, así como la inclusión, en ROMARIN, de copias en formato PDF de concesiones de protección, denegaciones provisionales y decisiones finales, todo esto desde enero de 2009). La realización del Subproyecto B5 ha terminado.

c) Colocación de los cimientos de la modificación del sistema

16. Como se indica en el informe anterior sobre la marcha de las actividades (documento MM/A/40/3), una serie de subproyectos técnicos de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. tiene por objeto colocar los cimientos de la ulterior modificación del sistema, en particular los Subproyectos C2 y C3, que sientan las bases de arquitectura para seguir desarrollando el sistema de T.I., y el Subproyecto C4, que tiene por objeto instalar la aplicación MAPS/DMAPS actual en un nuevo soporte físico, para obtener ahorros sustanciales de los costos de las operaciones vinculadas al funcionamiento de los sistemas MAPS/DMAPS.

17. Los avances en la aplicación de los Subproyectos C2, C3 y C4 chocaron con dificultades imprevistas. Una condición previa fundamental de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. consistía en identificar y lograr rápidamente el concurso de consultores externos con una amplia experiencia en el uso de ADABAS/Natural, a fin de liberar a los expertos empleados en la OMPI de sus actuales responsabilidades operativas. Se basaba esto en el reconocimiento de que el personal de la OMPI había adquirido una experiencia considerable en la gestión de los Sistemas de Madrid y de La Haya, dejando al equipo de informática la responsabilidad del mantenimiento regular y el apoyo a los sistemas MAPS y DMAPS desde 1996. En aras de la eficacia, era conveniente que los mismos miembros del personal de la OMPI se asignaran, por consiguiente, a la tarea de dirigir los diversos subproyectos del programa de modernización, liberándose de las tareas de mantenimiento y apoyo durante la realización del mismo. Ahora bien, el proceso de identificar y ganar el concurso de consultores experimentados en el uso de ADABAS/Natural resultó ser mucho más difícil de lo que se suponía. De hecho, hasta la fecha, sólo se han encontrado y contratado dos consultores.

i) *Base arquitectónica: ejecución de una plataforma de arquitectura orientada a los servicios*⁶

18. Al publicarse el informe anterior sobre la marcha de las actividades (documento MM/A/40/3), se había establecido el nivel básico de arquitectura orientada a los servicios que requiere el proyecto, así como el de solicitud de ofertas, lo que resultaría en la selección de instrumentos de arquitectura orientada a servicios que ha de aplicarse (véase el Subproyecto C2). Seguidamente se emitieron solicitudes de ofertas, procediéndose a evaluar las respuestas. En momento de preparar el presente documento, el resultado de la licitación se sometía a aprobación por el Comité de Revisión de Contratos. Se prevé ahora la realización de los Subproyectos C2 y C3 hasta el 31 de diciembre de 2009.

ii) *Economías en los gastos de explotación de los sistemas MAPS y DMAPS*

19. Este objetivo se logrará al culminar la realización del Subproyecto C4, consistente en el traslado a UNIX. Con arreglo a este Subproyecto, los sistemas MAPS y DMAPS migrarán de la computadora central IBM del Centro Internacional de Cálculo Electrónico de las Naciones Unidas (CICE) a un entorno UNIX. Además, se dotará al programa de las características técnicas necesarias para sustentar la evolución estratégica de las transacciones por vía electrónica, así como la eventual disponibilidad en el futuro de los programas MAPS y DMAPS todos los días a toda hora. Debido a que se prolongó más de lo previsto la negociación y aprobación de los arreglos financieros con el CICE, que servirá de anfitrión subcontratado de UNIX, la ejecución del Subproyecto C4 ha sufrido demoras. El proceso de migración como tal sólo pudo iniciarse en junio de 2009. Su terminación está prevista para octubre de 2009.

20. El retraso en el lanzamiento del Subproyecto C4 ha tenido por resultado la reprogramación de algunos otros subproyectos, debido a algunos conflictos insolubles en materia de recursos humanos (véase el Anexo II). Por otra parte, el retraso traerá aparejado un menor ahorro en costos de funcionamiento en 2009, lo que en parte afectará la financiación de las actividades de la Fase I (ha de recordarse que la Fase I debía financiarse parcialmente del ahorro obtenido en los gastos operativos del programa 27 (o sea, del programa 25 según el Presupuesto por programas revisado de 2008/09), equivalente a 1,9 millones de fr.s.). Sin embargo, sigue siendo pertinente continuar el esfuerzo a fin de realizar este programa, teniendo en cuenta la reducción de los gastos operativos en el futuro. El ahorro resultante en gastos de funcionamiento se hará efectivo en el bienio 2010-2011.

21. Más detalles sobre la situación de todos los subproyectos figuran en el Anexo II.


⁶ La arquitectura orientada a servicios es una arquitectura que se vale de servicios acoplados libremente, con el fin de atender las necesidades de distintos procesos y usuarios de un sistema de gestión.

III. FASE I – ESTADO DEL PRESUPUESTO

22. En el cuadro y gráfico que siguen se recoge el estado actual de los compromisos y los gastos relacionados con la ejecución del Programa de modernización de las tecnologías de la información a fines de junio de 2009:

| Descripción del proyecto | Presupuesto inicial | Gasto total | Total consignado en 2009 | Previsiones totales para 2010 | Saldo relativo a lo consignado en 2001 | Saldo relativo a 2009 + 2010 | Saldo relativo a 2009 + 2010 |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| C1 Organización del proyecto y gestión del cambio | 48.000 | 36.686 | 37.889 | -- | 11.314 | 10.111 | 10.111 |
| C2 Solicitud de ofertas y prueba preliminar | 48.000 | 17.803 | 87.506 | -- | 30.197 | (39.506) | (39.506) |
| C3 Arquitectura orientada a los servicios y herramientas | 72.000 | 16.705 | 105.509 | -- | 55.295 | (33.509) | (33.509) |
| A1 Traducción | 124.500 | 56.566 | 131.094 | -- | 67.934 | (6.594) | (6.594) |
| A2 Clasificación | 124.500 | 78.113 | 114.294 | -- | 46.387 | 10.206 | 10.206 |
| A4 Situación de las marcas | 240.000 | 11.517 | 117.530 | 135.000 | 228.483 | 122.470 | (12.530) |
| A6 Automatización de la gestión | 48.000 | 31.803 | 51.506 | -- | 16.197 | (3.506) | (3.506) |
| A7 Mejoras en el IMAPS | 48.000 | 16.221 | 51.424 | -- | 31.779 | (3.424) | (3.424) |
| A3 Notificaciones y avisos de irregularidad | 480.000 | 23.035 | 235.060 | 280.000 | 456.965 | 244.940 | (35.060) |
| C5 Proyecto piloto con una oficina | 599.200 | 28.755 | 323.766 | 300.000 | 570.445 | 275.434 | (24.566) |
| A5 Supervisión y estadística | 340.000 | 16.316 | 87.984 | -- | 323.684 | 252.016 | 252.016 |
| C6 Arquitectura completa + administración de los procesos de gestión + Middleware | 150.000 | 7.198 | 10.956 | 140.000 | 142.802 | 139.044 | (956) |
| C7 Sistema de gestión de bases de datos y mejoras técnicas | 240.000 | 11.517 | 37.530 | 200.000 | 228.483 | 202.470 | 2.470 |
| B1 Pago electrónico, factura electrónica | 240.000 | 11.517 | 117.530 | 125.000 | 228.483 | 122.470 | (2.530) |
| B2 Modificación electrónica | 336.000 | 16.124 | 124.542 | 215.000 | 319.876 | 211.458 | (3.542) |
| B3 Situación de las comunicaciones | 240.000 | 11.517 | 137.530 | 100.000 | 228.483 | 102.470 | 2.470 |
| B5 Comunicación electrónica: Oficina → titulares y representantes | 120.000 | 103.509 | 126.515 | -- | 16.491 | (6.515) | (6.515) |
| C4 Traslado a UNIX | 1.529.875 | 109.133 | 1.625.843 | -- | 1.420.742 | (95.968) | (95.968) |
| Total | 5.028.075 | 604.039 | 3.524.005 | 1.495.000 | 4.424.036 | 1.504.070 | 9.070 |
| Porcentaje del total | 100,00% | 12,01% | 70,09% | 29,73% | 87,99% | 29,91% | 0,18% |

Presupuesto del proyecto de modernización del MAPS
2008-09

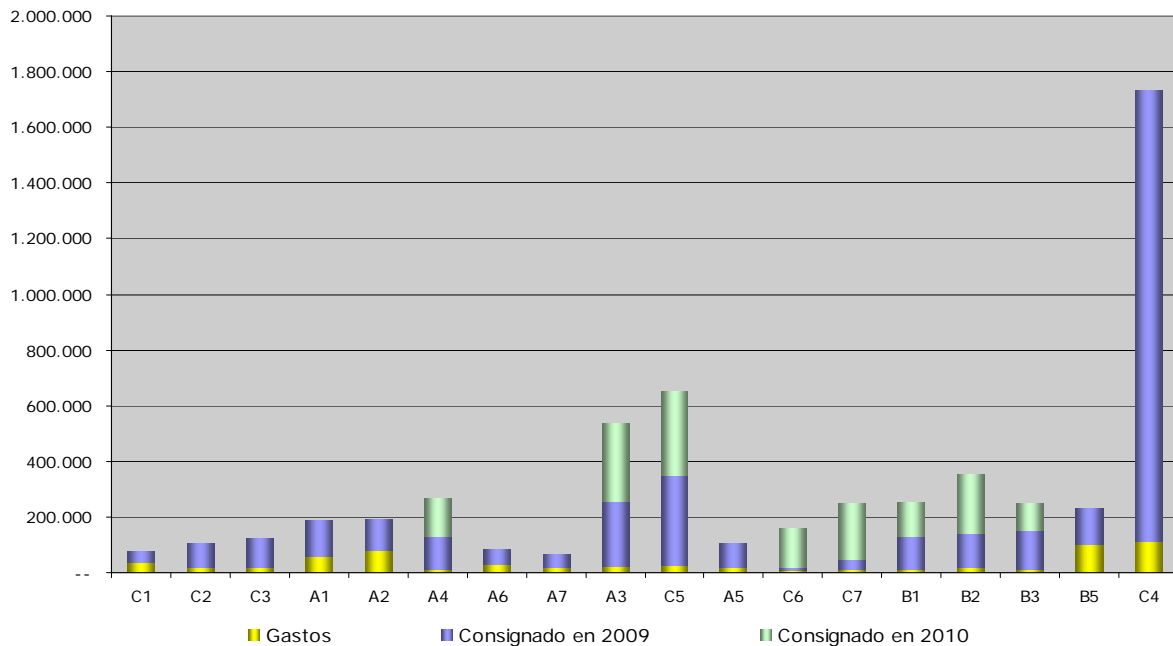

IV. CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS METAS ESTABLECIDAS

Fase I

23. Teniendo en cuenta el estado de ejecución de los diversos subproyectos, se estima ahora que la realización de la Fase I culminará a fines de 2010, con arreglo al calendario que se ilustra en el gráfico siguiente.

| Nº | Designación de la tarea | 2008 | | | | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | |
|----|---|--------------|---|----|-----|------|---|----|-----|------|---|----|-----|------|---|----|--|
| | | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | |
| 1 | C1- Organización del proyecto y gestión del cambio | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | C2 – Solicitud de ofertas y prueba preliminar | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | C4 – Traslado a UNIX | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | C3 – Arquitectura orientada a los servicios y herramientas | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | A1 - Traducción | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | A2 - Clasificación | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | A4 – Situación de las marcas | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | A6 – Automatización de la gestión | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | A3 – Notificaciones y avisos de irregularidad | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | A7 – Mejoras en el IMAPS | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | C5 – Proyecto piloto con una oficina (incluidos B4 y B6) | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | A5 – Supervisión y estadística | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | C6 – Arquitectura completa + administración de los procesos de gestión + Middleware | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | C7 – Sistema de gestión de bases de datos y mejoras técnicas | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | B1 – Pago electrónico, factura electrónica | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | B2 – Modificación electrónica | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | B3 – Situación de las comunicaciones | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | B5 – Comunicación electrónica: Oficina/titulares y representantes | [Barra azul] | | | | | | | | | | | | | | | |

Fases II y III

24. Al aprobar la ejecución de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. en septiembre de 2007, las Asambleas de la Unión de Madrid y de la Unión de La Haya tomaron nota de que la Oficina Internacional formularía a su debido tiempo propuestas concretas en relación con las Fase II y III.⁷ Como primera estimación, la realización de la Fase II quedó prevista para los años 2010 y 2011. La realización de la Fase III dependería de un ulterior análisis acerca de su eventual necesidad y, en caso afirmativo, para cuándo.

⁷ Párrafo 46.iii) del documento MM/A/38/4.

25. El enfoque adoptado inicialmente por el programa consistía en seguir utilizando la base de datos ADABAS/Natural y su lenguaje de programación, teniendo en cuenta que los usuarios se sienten por lo general sumamente satisfechos con la funcionalidad de los sistemas MAPS y DMAPS. En lugar de apuntar a un sistema completamente nuevo, el programa de modernización buscó aprovechar aún más la inversión original para el desarrollo del sistema, recurriendo a: i) la migración de los sistemas MAPS y DMAPS a una plataforma operativa menos costosa; ii) autorizar el acceso por Internet a los sistemas de aplicación MAPS y DMAPS, de modo que las transacciones de los sistemas estuvieran abiertas y, por lo tanto, disponibles fuera del ámbito interno, con el consiguiente aumento de los beneficios para los miembros de la Unión de Madrid, así como para los titulares y representantes, y iii) resolver las insuficiencias intrínsecas de un sistema de computadora central para el tratamiento de textos requerido en la confección de notificaciones, así como en las labores de clasificación y traducción.

26. Como se indicó al inicio del programa de modernización (párrafo 29 del documento MM/A/38/4), en la Fase II se contaba con el traslado parcial del programa interactivo Natural al programa Java (Subproyecto C8), junto con el perfeccionamiento ulterior del subsistema de publicación electrónica (Subproyecto C10). La Fase III, que daría lugar a una migración completa a un nuevo entorno técnico al abandonar las técnicas ADABAS/Natural (Subproyectos C9 y C11), tenía entonces un valor optativo.

27. Sin embargo, como ya se mencionó, la Oficina Internacional ha tropezado con grandes dificultades para encontrar consultores con amplias experiencias en ADABAS/Natural, al tiempo que las tecnologías ADABAS y Natural parecen sufrir un rápido declive en los mercados. El hecho es que resulta prácticamente imposible conseguir un personal suficientemente preparado en dichas tecnologías.

28. Estas dificultades de contratación han conducido a la Oficina Internacional a plantearse si es sensato mantener la dependencia de las operaciones de Madrid y de La Haya a tecnologías para las cuales está claro que la disponibilidad de personal cualificado es peligrosamente escasa en el mercado, siendo poco probable que esta situación mejore. La conclusión de la Oficina Internacional es que los riesgos que presentaría el seguir manteniendo la dependencia de los sistemas a las tecnologías ADABAS y Natural son demasiado grandes, por lo que se imponen medidas apropiadas.

29. Por consiguiente, en opinión de la Oficina Internacional, ha pasado a ser la opción más realista la ejecución de la Fase III lo antes posible.

30. Basándose en las informaciones disponibles a la fecha, la Oficina Internacional estima que las Fases II y III podrían realizarse con arreglo al calendario que recoge el siguiente gráfico.

| Nº | Designación de la tarea | 2009 | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|----|--|------|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
| | | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | C8- Otros procesos de gestión, portales y aplicaciones ricas de Internet | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | C10 - Publicación | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3 | C9 – Otros servicios interactivos de Internet | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 4 | C11 – Otras conversiones a Java / Oracle | | ■ | | | | | | | | | | | |

V. MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS FASES II y III

31. Una posible opción para la puesta en práctica de las Fases II y III sería la de basarse en la labor efectuada internamente, junto con la participación de consultores o proveedores externos. Ahora bien, los costos asociados a este enfoque tal vez deban confirmarse, considerando las estimaciones incluidas en el informe de consultoría elaborado por *Sogeti SA Switzerland* en el verano de 2007, cuando se preparaba el lanzamiento del programa de modernización. Por otra parte, también sería necesario añadir un nuevo elemento de riesgo, dadas las proporciones y la complejidad del esfuerzo que implica el diseño de nuevos sistemas en una tecnología desconocida para el personal.

32. Al examinar las modalidades de ejecución de las Fases II y III surgen diversas opciones relacionadas con la arquitectura técnica final, que también deben tenerse en cuenta. Una opción consistiría en establecer un entorno Oracle/Java idéntico o similar a la nueva arquitectura técnica del PCT⁸. Otra opción consistiría en establecer un entorno Microsoft .NET. Las ventajas de adoptar los sistemas Oracle/Java empleados por el PCT consisten en que luego un solo entorno técnico atendería todos los programas informáticos de aplicación en las principales operaciones de la OMPI, con la consiguiente economía de escala que trae consigo una arquitectura única. El inconveniente de adoptar los sistemas Oracle/Java empleados por el PCT sería tal vez el costo, ya que los nuevos productos de Microsoft .NET son generalmente menos costosos, tanto en lo que se refiere a su instalación como a su ulterior mantenimiento.

33. Un enfoque de ejecución alternativo sería el de contratar los servicios de una empresa exterior a los efectos de convertir los sistemas MAPS y DMAPS para pasar de la tecnología ADABAS/Natural a una tecnología sustitutiva que determine la propia compañía (Oracle/Java o Microsoft .NET, por ejemplo). Ha de tenerse en cuenta que una porción significativa de las complejidades técnicas ligadas a las operaciones de MAPS y DMAPS reside en el sistema de

⁸ Actualmente, la Oficina Internacional está abocada al desmantelamiento de los sistemas de aplicación legados en el PCT, que también dependen de ADABAS/Natural y se han sustituido por una solución técnica moderna de tres niveles de Oracle/Java, que es el resultado de varios años de elaboración.

flujos de trabajo específicos incorporados a la solución técnica. Como la Fase I del programa de modernización incluye la introducción de herramientas de flujos de trabajo estándar (módulos de proceso de gestión BPM), toda acción de conversión de los sistemas MAPS y DMAPS no abarcaría la conversión de su funcionalidad a los flujos de trabajo modificados.

VI. ENFOQUE RECOMENDADO PARA LAS FASES II y III

34. Para la ejecución de las Fases II y III, la Oficina Internacional recomienda organizar una licitación pública internacional con vistas a escoger una empresa capaz de:

i) efectuar una evaluación técnica de los sistemas y bases de datos de las aplicaciones MAPS y DMAPS a los efectos de su conversión a una nueva arquitectura técnica;

ii) proponer una arquitectura técnica final apropiada; y

iii) preparar una oferta de precio fijo para la conversión del programa informático y los datos de las aplicaciones MAPS y DMAPS a la nueva arquitectura técnica propuesta, incluida la ejecución de las consiguientes pruebas del sistema y el establecimiento de referencias de rendimiento de los sistemas, junto con un período de garantía apropiado.

35. El apoyo operativo a un plazo más largo de la solución tras la conversión se diseñaría siguiendo el método actualmente aplicado con éxito en los sistemas de planificación institucional de los recursos de la OMPI, es decir, la contratación de un proveedor exterior, a quien se encargaría el desarrollo permanente de la solución. La administración de tales contratos correría por cuenta de un equipo interno central de expertos técnicos con gran experiencia de gestión. El equipo interno sería responsable de las operaciones cotidianas del sistema, pudiendo también introducir mejoras menores.

36. La Oficina Internacional confía en que, de seguirse el enfoque recomendado en el párrafo 34, no se sobrepasarían los costos originariamente estimados para las Fases II y III (o sea, 1.943.000 fr.s. y 8.292.000 fr.s., respectivamente). La Oficina Internacional también confía en que la propuesta del párrafo 35, relativa a un apoyo permanente a la solución técnica, se ajustaría a las prácticas comunes en la industria, siguiendo el ejemplo del modelo de apoyo a los sistemas de planificación institucional de los recursos de la OMPI.

VII. FINANCIACIÓN DE LAS FASES I, II Y III

Resto de la Fase I

37. Como se recuerda en el párrafo 3, un presupuesto de 5.028.000 fr.s. había sido aprobado para la ejecución de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. en 2008-2009. No obstante, debido a las demoras en la ejecución del programa, por los motivos expuestos más arriba en el presente documento, a fines de 2009 sólo se habrán utilizado 3.524.000 fr.s. Todavía se necesitará la mayor parte del saldo de 1.504.000 fr.s. (más precisamente, un monto estimado en 1.495.000 fr.s.) a fin de completar la ejecución de la Fase I en 2010.

38. Se espera que los recursos destinados a financiar el importe de 3.524.000 fr.s. que debe abonarse en 2008-2009, provenga de los siguientes orígenes: 1.450.000 fr.s. del presupuesto por programas revisado de 2008/09 (incluido 1 millón de fr.s. del programa 6 y 450.000 fr.s. del programa 25); 2.074.000 fr.s. asignados especialmente con tal fin del Fondo de Reserva de la Unión de Madrid.

39. Se propone que la financiación de 1.495.000 fr.s. que, según las estimaciones actuales, se necesitan para completar la ejecución de la Fase I en 2010, provenga del Fondo de Reserva de la Unión de Madrid, tal como se expone en el párrafo 49 *infra*.

Fase II

40. Según se indica en el documento MM/A/38/4, la ejecución de la Fase II del Programa de modernización de las T.I., prevista en el período 2010/2011, tendrá un costo estimado de 1.943.000 fr.s., para compartir entre la Unión de Madrid (1.432.000 fr.s.) y la Unión de La Haya (511.000 fr.s.).

41. Se propone que la parte de la Unión de Madrid (1.432.000 fr.s.) se financie con cargo al Fondo de Reserva de la Unión de Madrid, tal como se expone en el párrafo 49 *infra*. Siempre que las Asambleas de la Unión del PCT y de la Unión de La Haya lo aprueben, la parte que ha de abonar la Unión de La Haya (511.000 fr.s.) se financiaría con cargo al Fondo de Reserva del PCT, en el entendido de que la Unión de La Haya reembolsaría dicha suma a la Unión del PCT apenas lo permita el dinero disponible en el Fondo de Reserva de la Unión de La Haya.

Fase III

42. Según se indica en el documento MM/A/38/4, el costo de inversión de la Fase III, estimado en 8.292.000 fr.s., también estaría compartido entre los presupuestos de la Unión de Madrid (5.804.400 fr.s.) y de la Unión de La Haya (2.487.600 fr.s.).

43. Se propone que la parte que ha de abonar la Unión de Madrid (5.804.400 fr.s.) se financie con cargo al Fondo de Reserva de la Unión de Madrid, según se indica en el párrafo 49 *infra*. Siempre que las Asambleas de la Unión del PCT y de la Unión de La Haya lo aprueben, la parte correspondiente a la Unión de La Haya (2.487.600 fr.s.) se financiaría con cargo al Fondo de Reserva del PCT, en el entendido de que la Unión de La Haya reembolsaría dicha suma a la Unión del PCT apenas lo permita el dinero disponible en el Fondo de Reserva de la Unión de La Haya.

Asignación de Recursos del Fondo de Reserva y del Fondo de Operaciones de la Unión de Madrid (FRO)

44. Como se señala en el párrafo 4, se recuerda que la Asamblea de la Unión de Madrid, al aprobar en 2007 la ejecución de la Fase I del programa de modernización de las tecnologías de la información, decidió también que todo excedente generado en el presupuesto de la Unión de Madrid al término de 2007 por encima de la cantidad necesaria para cubrir el nivel previsto de reservas (25% del gasto estimado en el bienio 2008/09 (factor PGBE)) quedaría en el FRO de la Unión de Madrid, a los efectos de contribuir a la financiación de las siguientes etapas del Programa de modernización de las tecnologías de información.

45. Al 31 de diciembre de 2007, el presupuesto de la Unión de Madrid correspondiente a 2006/07 había generado un excedente de 24,5 millones de fr.s., elevando el nivel de reservas de los FRO de la Unión de Madrid a un total de 41.773.000 fr.s. Esta cantidad se reajustó con arreglo al método aprobado por los Estados miembros, alcanzando 41.510.000 fr.s. al 1 de enero de 2008⁹.

46. En el presupuesto por programas revisado para el bienio 2008/09, aprobado por las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI en diciembre de 2008, se ha previsto que el presupuesto de la Unión de Madrid tenga un déficit de 124.000 fr.s. en el bienio 2008/09. Por consiguiente, el nivel de los FRO de la Unión de Madrid se estableció en 41.386.000 fr.s. ($41,510 - 0,124 = 41,386$), efectivo al terminar 2009. Entretanto, el nivel previsto de los FRO para 2008/09 (25% del gasto bienal estimado (factor PGBE)) se estableció en 26.587.000 fr.s. (incluido el Fondo de operaciones de 2 millones de fr.s.).

47. Asimismo, en diciembre de 2008, las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI aprobaron la asignación de una cantidad cifrada en 2.644.000 fr.s. de los FRO de la Unión de Madrid para sufragar la parte correspondiente a la Unión de Madrid de la financiación de una serie de proyectos (seguridad, IPSAS/Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera, etc.) aprobados en dichas Asambleas.

48. Como se explica en el párrafo 38, se espera que para fines de 2009 se hayan utilizado 2.074.000 fr.s. de los FRO de la Unión de Madrid, en cumplimiento de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. en el bienio 2008/09, de conformidad con las decisiones de la Asamblea de la Unión de Madrid de 2007 (véase también al respecto el párrafo 3 *supra*).

49. En resumen, se espera que, a fines de 2009, se seguirá contando con unos 10.081.000 fr.s. ($41,386 - (26,587 + 2,644 + 2,074) = 10,081$) en los FRO de la Unión de Madrid. Según decidiera la Asamblea de la Unión de Madrid en 2007, estos recursos se han mantenido en reserva para contribuir a la financiación de las siguientes etapas del programa de modernización. Como señalan los párrafos 39, 41 y 43, se ha estimado que la parte de la Unión de Madrid de la financiación requerida para ejecutar el resto de la Fase I y las Fases II y III del programa de modernización de las T.I. en el bienio 2010/11 totalizaría 8.731.000 fr.s. ($1,495 + 1,432 + 5,804 = 8,731$). Por consiguiente, se propone asignar dicha cantidad, 8.731.000 millones de fr.s., con cargo a los FRO de la Unión de Madrid, a fin de sufragar dicha parte.

50. *Se invita a la Asamblea a:*

i) tomar nota del estado de ejecución de la Fase I del Programa de modernización de las T.I. que se describe en los párrafos 5 a 22 y en el Anexo II del presente documento;

⁹ El reajuste es el resultado de la aplicación del método de asignación de ingresos y gastos ajustados (véase el Anexo IV del presupuesto por programas revisado para 2008/09), adoptado por los Estados miembros como parte del presupuesto por programas de 2008/09.

ii) aprobar la ejecución del resto de la Fase I y de las Fases II y III del Programa de modernización de las T.I. en el bienio 2010/11, según se propone en los párrafos 23, 30 y 34 a 43 del presente documento;

iii) aprobar la financiación del resto de la Fase I y de las Fases II y III del Programa de modernización de las T.I. como se propone en el párrafo 49 del presente documento.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
SUBPROYECTOS

Cuadro 1: Funcionamiento interno

| Sec. | Proyecto | Descripción | Categoría |
|------|--|---|-------------|
| A1 | Traducción | Actualizar las herramientas de traducción para sustituir las creadas en la Organización por otras de tipo comercial. | Operacional |
| A2 | Clasificación | Actualizar las herramientas de clasificación de Niza integrando la base de datos de productos y servicios aceptados en los procedimientos de clasificación. Desarrollar una aplicación Internet para ayudar a los usuarios en la composición de listas. | Operacional |
| A3 | Notificaciones y avisos de irregularidad | Actualizar el procedimiento de creación de notificaciones para producir documentos más comprensibles. | Operacional |
| A4 | Situación de las marcas | Crear herramientas que muestren los productos y servicios protegidos en una Parte Contratante designada y la manera en que los mismos cambian en el tiempo. | Operacional |
| A5 | Supervisión y estadística | Crear herramientas para supervisar y analizar los procesos operativos. Crear estadísticas de uso interno y externo. | Analítica |
| A6 | Automatización de la gestión | Integrar las funciones administrativas internas en el sistema MAPS/IMAPS, por ejemplo, importando documentos en Word, mensajes de correo electrónico, etc. directamente en los sistemas MAPS/IMAPS. | Operacional |
| A7 | Mejoras en el IMAPS | Mejoras en el IMAPS (por ejemplo, capacidades de búsqueda, nuevos formatos de documento, vinculación más estrecha con el MAPS,...). | Operacional |

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
SUBPROYECTOS

Cuadro 2: Comunicación externa

| Sec. | Proyecto | Descripción | Categoría |
|------|---|--|-------------------------|
| B1 | Pago electrónico, factura electrónica | Crear un sistema de facturas electrónicas (para los extractos del Registro Internacional) y de pago electrónico (para otras transacciones) para los titulares. | Transacción electrónica |
| B2 | Modificación electrónica | Permitir a los titulares de registros efectuar transacciones electrónicas y seguir automatizando su tramitación en el MAPS. | Transacción electrónica |
| B3 | Situación de las comunicaciones | Permitir a los titulares de registros que verifiquen en qué situación se hallan sus comunicaciones con la OMPI. | Transacción electrónica |
| B4 | Comunicación electrónica: Oficinas → OMPI | Mejorar la transmisión de información de las oficinas nacionales a la OMPI. | Transacción electrónica |
| B5 | Comunicación electrónica: OMPI → Titulares/Representantes | Mejorar la transmisión de información de la OMPI a los titulares de registros y a los representantes. | Transacción electrónica |
| B6 | Comunicación electrónica: OMPI → Oficinas | Crear herramientas que fomenten la colaboración entre la OMPI y las oficinas nacionales o regionales con respecto al procedimiento internacional. | Transacción electrónica |

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
SUBPROYECTOS

Cuadro 3: De gobernanza y técnicos

| Sec. | Proyecto | Descripción | Categoría |
|------|---|--|--------------|
| C1 | Organización del proyecto y gestión del cambio | Establecer procedimientos que faciliten la ejecución de esos proyectos. | Gobernanza |
| C2 | Solicitud de ofertas y prueba preliminar ¹⁰ | Solicitud de ofertas (licitaciones) y prueba preliminar de la solución técnica. | Gobernanza |
| C3 | Arquitectura orientada a los servicios ¹¹ y herramientas | Crear la arquitectura de T.I. (orientada a los servicios) y suministrar las herramientas necesarias para su uso. | Arquitectura |
| C4 | Traslado al Unix | Trasladar los sistemas MAPS y DMAPS de la computadora central del CICE a un entorno UNIX. | Reducción |
| C5 | Proyecto piloto con una Oficina | Proyecto piloto con una oficina nacional sobre la base del acceso directo al MAPS. (Arquitectura orientada a los servicios + administración de los procesos de gestión ¹² + transacción electrónica + portal ¹³ + aplicación rica de Internet ¹⁴). | Conversión |
| C6 | Arquitectura completa + administración de los procesos de gestión + <i>Middleware</i> | Adaptar la arquitectura de T.I. y los procesos de gestión basados en la experiencia con el proyecto piloto (C5) para permitir su expansión a otras oficinas interesadas. | Conversión |
| C7 | Sistema de gestión de bases de datos ¹⁵ y mejoras técnicas | Mejorar el diseño de la base de datos del MAPS y resolver los problemas técnicos. | Conversión |
| C8 | Otros procesos de gestión, portales y aplicaciones ricas de Internet | Trasladar los algoritmos funcionales de <i>Natural</i> a <i>Java</i> , pero conservando <i>Adabas</i> . | Conversión |

¹⁰ Prueba preliminar: verificar que la arquitectura técnica propuesta funciona con arreglo a las especificaciones.

¹¹ Arquitectura orientada a los servicios: arquitectura que utiliza servicios más o menos vinculados entre sí para satisfacer las necesidades de los usuarios y los procedimientos de gestión.

¹² Administración de los procesos de gestión.

¹³ Portal: una interfaz de Internet proporciona acceso individualizado a los usuarios con arreglo a su perfil de seguridad.

¹⁴ Aplicación rica de Internet: una aplicación de Internet que posee las ventajas y las funciones de las aplicaciones tradicionales.

¹⁵ Sistema de gestión de bases de datos (DBMS).

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
SUBPROYECTOS

| Sec. | Proyecto | Descripción | Categoría |
|------|--|--|--------------|
| C9 | Otros servicios interactivos de Internet | En caso necesario, definir los procesos y elaborar una nueva interfaz de usuario con tecnología común para la OMPI y las oficinas nacionales o regionales. | Conversión |
| C10 | Publicación | Modernizar el proceso de publicación, incluida la sustitución de los antiguos programas <i>Visual Basic</i> . | Arquitectura |
| C11 | Otras conversiones en <i>Java / Oracle</i> | Trasladar los programas restantes <i>Natural /Adabas</i> a <i>Java/Oracle</i> en caso necesario, pero no antes de 2010. | Conversión |

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

**PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN: INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SUBPROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2009**

| A1 Traducción | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 124.500 | 56.566 | 131.094 | -- | 67.934 | (6.594) | (6.594) |
| Descripción | Actualizar las herramientas de traducción para sustituir las creadas en la Organización por otras de tipo comercial. | | | | | | |
| Beneficios | Mayor automatización, costos reducidos, calidad mejorada. | | | | | | |
| Situación actual | Se está probando la aplicación para automatizar la traducción de invalidaciones mediante la traducción de la lista básica (Beta Test), al 31 de mayo de 2009. | | | | | | |

| A2 Clasificación | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 124.500 | 78.113 | 114.294 | -- | 46.387 | 10.206 | 10.206 |
| Descripción | Actualizar las herramientas de clasificación de Niza integrando la base de datos de productos y servicios aceptados en los procedimientos de clasificación. Desarrollar una aplicación Internet para ayudar a los usuarios en la composición de listas. | | | | | | |
| Beneficios | Presentación de la base de datos de términos válidos en Internet, como ayuda a los usuarios del Sistema de Madrid a la hora de revisar sus listas de productos y servicios. | | | | | | |
| Situación actual | Reduce el tiempo de tratamiento y traducción automática de las listas validadas anteriormente. Un prototipo de la aplicación <i>E-Classification</i> se encuentra en Intranet y es objeto de pruebas, desde mayo de 2009. | | | | | | |

| A3 Notificaciones y avisos de irregularidad | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 480.000 | 23.035 | 235.060 | 280.000 | 456.965 | 244.940 | (35.060) |
| Descripción | Actualizar el procedimiento de creación de notificaciones para producir documentos más comprensibles. | | | | | | |
| Beneficios | Producción de avisos más completos. | | | | | | |
| Situación actual | Un grupo de trabajo está elaborando los requisitos. | | | | | | |

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN: INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SUBPROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2009

| A4 Situación de las marcas | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 240.000 | 11.517 | 117.530 | 135.000 | 228.483 | 122.470 | (12.530) |
| Descripción | Crear herramientas que muestren los productos y servicios protegidos en una Parte Contratante designada y la manera en que los mismos cambian en el tiempo. | | | | | | |
| Beneficios | Presentación mejor y más clara de la situación de las marcas de la Parte Contratante del caso. | | | | | | |
| Situación actual | Un grupo de trabajo está elaborando las modificaciones a partir de la política de examen de las herramientas de tecnologías de la información que se requieren para determinar los productos y servicios que afectan a la Parte Contratante designada. | | | | | | |
| A5 Supervisión y estadística | | | | | | | |
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 340.000 | 16.316 | 87.984 | -- | 323.684 | 252.016 | 252.016 |
| Descripción | Crear herramientas para supervisar y analizar los procesos operativos. Crear estadísticas de uso interno y externo. | | | | | | |
| Beneficios | Acceso a estadísticas a través de Intranet e Internet. | | | | | | |
| Situación actual | Un prototipo de la aplicación para la búsqueda en Internet se encuentra en Intranet y es objeto de pruebas, al 10 de mayo de 2009. | | | | | | |
| A6 Automatización de la gestión | | | | | | | |
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 48.000 | 31.803 | 51.506 | -- | 16.197 | (3.506) | (3.506) |
| Descripción | Integrar las funciones administrativas internas en el sistema MAPS/IMAPS. | | | | | | |
| Beneficios | Menos procedimientos manuales, menos tratamiento en papel. | | | | | | |
| Situación actual | Se ha completado el nuevo procedimiento de impresión mediante tecnología OMR. Se ha completado la automatización del sistema de correo electrónico certificado. Se ha completado la automatización de la confección de copias certificadas de solicitudes de La Haya. | | | | | | |
| A7 Mejoras en el IMAPS | | | | | | | |
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 48.000 | 16.221 | 51.424 | -- | 31.779 | (3.424) | (3.424) |
| Descripción | Mejoras en el IMAPS (por ejemplo, capacidades de búsqueda, nuevos formatos de documento, vinculación más estrecha con el MAPS,...). | | | | | | |
| Beneficios | Funciones adicionales para el usuario. | | | | | | |
| Situación actual | Se ha completado la exportación de los documentos Tiff en formato PDF. Se han completado las nuevas funciones de índice e impresión. Gestión en curso del formato originario PDF en IMAPS. | | | | | | |

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN: INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SUBPROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2009

| B1 Pago electrónico, factura electrónica | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 240.000 | 11.517 | 117.530 | 125.000 | 228.483 | 122.470 | (2.530) |
| Descripción | Crear un sistema de facturas electrónicas (para los extractos del Registro Internacional y de pago electrónico (para otras transacciones) para los titulares. | | | | | | |
| Beneficios | Facilidad de pago electrónico para los usuarios del Sistema de Madrid. Reducción del tiempo de tratamiento en finanzas. | | | | | | |
| Situación actual | Es posible efectuar pagos a través de Internet mediante tarjeta de crédito o cuenta corriente para el pago de tasas tras recepción de un aviso de irregularidad. En vías de estudio la posibilidad de facturación electrónica para los extractos y pago electrónico de las tasas estándar. Otras funciones de gestión electrónica del subproyecto B1 se introducirán a través de un proyecto común por el cual titulares y representantes estarán en condiciones de gestionar y ejecutar electrónicamente, por Internet, determinadas transacciones de sus carpetas del Sistema de Madrid. | | | | | | |
| B2 Modificación electrónica | | | | | | | |
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 336.000 | 16.124 | 124.542 | 215.000 | 319.876 | 211.458 | (3.542) |
| Descripción | Permitir a los titulares de registros efectuar transacciones electrónicas y seguir automatizando su tramitación en el MAPS. | | | | | | |
| Beneficios | Reducción del tiempo de tratamiento para los usuarios. Reducción de la carga de trabajo (equipo de gestión del correo) | | | | | | |
| Situación actual | Las funciones de gestión electrónica del subproyecto B2 se aplicarán a través de un proyecto común por el cual titulares y representantes estarán en condiciones de gestionar y ejecutar electrónicamente, por Internet, determinadas transacciones de sus carpetas del Sistema de Madrid. | | | | | | |
| B3 Situación de las comunicaciones | | | | | | | |
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 240.000 | 11.517 | 137.530 | 100.000 | 228.483 | 102.470 | 2.470 |
| Descripción | Permitir a los titulares de registros que verifiquen en qué situación se hallan sus comunicaciones con la OMPI. | | | | | | |
| Beneficios | Mejor comunicación con los titulares. Menos solicitudes enviadas por los titulares. | | | | | | |
| Situación actual | Las funciones de gestión electrónica del subproyecto B3 se aplicarán a través de un proyecto común por el cual titulares y representantes estarán en condiciones de gestionar y ejecutar electrónicamente, por Internet, determinadas transacciones de sus carpetas del Sistema de Madrid. | | | | | | |

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN: INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SUBPROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2009

B4 Comunicación electrónica: Oficinas -> OMPI

Presupuesto, descripción y situación actual figuran en C5

B5 Comunicación electrónica: OMPI -> Titulares/representantes

| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
|------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| Presupuesto | 120.000 | 103.509 | 126.515 | -- | 16.491 | (6.515) | (6.515) |
| Descripción | Mejorar la transmisión de información de la OMPI a los titulares de registros y a los representantes. | | | | | | |
| Beneficios | Mejor comunicación con los titulares. Reducción de costos por el menor volumen de comunicaciones escritas. | | | | | | |
| Situación actual | Actualmente la Gaceta sólo aparece en Internet y se le han añadido funciones de búsqueda. La notificación de algunas comunicaciones puede ahora obtenerse por Internet (ROMARIN) Es posible también la notificación de algunas comunicaciones por correo electrónico certificado. | | | | | | |

B6 Comunicación electrónica: OMPI -> Oficinas

Presupuesto, descripción y situación actual figuran en C5

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN: INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SUBPROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2009

| C1 Organización del proyecto y gestión del cambio | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 48.000 | 36.686 | 37.889 | 0 | 11.314 | 10.111 | 10.111 |
| Descripción | Establecer procedimientos que faciliten la ejecución de esos proyectos. | | | | | | |
| Beneficios | Facilitar el avance del proyecto. | | | | | | |
| Situación actual | Terminado. Oficina y equipo del proyecto en funciones. | | | | | | |
| C2 Solicitud de ofertas y prueba preliminar | | | | | | | |
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 48.000 | 17.803 | 87.506 | -- | 30.197 | (39.506) | (39.506) |
| Descripción | Solicitud de ofertas (licitaciones) y prueba preliminar de la solución técnica. | | | | | | |
| Beneficios | Suministro de una plataforma de soporte físico y programa y servicios de anfitrión para UNIX y plataforma de arquitectura orientada a los servicios. | | | | | | |
| Situación actual | Se están evaluando las ofertas de los participantes en la licitación y los resultados se someten a la confirmación del Comité de examen de los contratos. | | | | | | |
| C3 Arquitectura orientada a los servicios y herramientas | | | | | | | |
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 72.000 | 16.705 | 105.509 | -- | 55.295 | (33.509) | (33.509) |
| Descripción | Crear la arquitectura de T.I. (orientada a los servicios) y suministrar las herramientas necesarias para su uso. | | | | | | |
| Beneficios | Suministro de las herramientas necesarias para el desarrollo de otros proyectos. | | | | | | |
| Situación actual | Se está procediendo a la evaluación final de las ofertas de los participantes en la licitación para la arquitectura orientada a los servicios. La aplicación técnica tendrá lugar inmediatamente después. | | | | | | |

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN: INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SUBPROYECTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2009

| C4 Traslado al Unix | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | .529.875 | 109.133 | 1.625.843 | -- | 1.420.742 | (95.968) | (95.968) |
| Descripción | Trasladar los sistemas MAPS y DMAPS de la computadora central del CICE a un entorno UNIX. | | | | | | |
| Beneficios | Reducción de los costos de funcionamiento de MAPS/DMAPS. | | | | | | |
| Situación actual | Análisis general: terminado. Análisis pormenorizado: terminado. Selección de los servicios de consultoría para efectuar la migración, mediante una solicitud de ofertas: terminado. Nuevo contrato con el CICE: terminado. Aplicación técnica: iniciado en junio de 2009 | | | | | | |

| C5 Proyecto piloto con una oficina (incluye también los subproyectos B4 y B6) | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 599.200 | 28.755 | 323.766 | 300.000 | 570.445 | 275.434 | (24.566) |
| Descripción | Proyecto piloto con una oficina nacional sobre la base del acceso directo al MAPS. (Arquitectura orientada a los servicios + administración de los procesos de gestión + transacción electrónica + portal + aplicación rica de Internet). | | | | | | |
| Beneficios | Aplicación, utilización, validación y aprendizaje de nuevas tecnologías (arquitectura orientada a los servicios + administración de los procesos de gestión + transacción electrónica + portal + aplicación rica de Internet). | | | | | | |
| Situación actual | Depende de la terminación de los subproyectos C2 y C3. Su iniciación está prevista para el 1 de septiembre de 2009. | | | | | | |

| C6 Arquitectura completa + Administración de los procesos de gestión + Middleware | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 2009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 150.000 | 7.198 | 10.956 | 140.000 | 142.802 | 139.044 | (956) |
| Descripción | Adaptar la arquitectura de T.I. y los procesos de gestión basados en la experiencia con el proyecto piloto (C5) para permitir su expansión a otras oficinas interesadas. | | | | | | |
| Beneficios | Permitirá a diversas Partes Contratantes beneficiarse de las nuevas herramientas de arquitectura orientada a los servicios. | | | | | | |
| Situación actual | Para iniciar al término de los subproyectos C2, C3 y C5 | | | | | | |

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
 INFORMACIÓN: INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS SUBPROYECTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2009

| C7 Gestión de mejora de bases de datos y mejoras técnicas | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| | <i>Presupuesto inicial</i> | <i>Gasto total</i> | <i>Total consignado en 20092009</i> | <i>Previsiones para 2010</i> | <i>Saldo relativo al gasto</i> | <i>Saldo relativo a lo consignado en 2009</i> | <i>Saldo relativo a 2009+2010</i> |
| Presupuesto | 240.000 | 11.517 | 37.530 | 200.000 | 228.483 | 202.470 | 2.470 |
| Descripción | Mejorar el diseño de la base de datos del MAPS y resolver los problemas técnicos. | | | | | | |
| Beneficios | Adaptación de la base de datos a las nuevas herramientas. | | | | | | |
| Situación actual | Para iniciar al término de los subproyectos C2, C3 y C5 | | | | | | |

[Fin del Anexo II y del documento]
